

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CITTA' DI GIAVENO

PROTOCOLLO

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA **BORGATA FUSERO n. 1**

PROPRIETA'

CITTA' DI GIAVENO

Via M. T. Marchini n. 1 - Giaveno

IDENTIFICATIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI

(art. 40 D.P.R. 207/2010)

PROGETTAZIONE



CHM INGEGNERIA

Ing. Marcello CHIAMPO

Via Roma n. 14 - 10094 - GIAVENO (TO) Tel. 011/9376657 - Fax 011/9363689 Email: info@studiochiampo.it

Pec: marcello.chiampo@ingpec.eu Cod. Fisc.: CHM MCL 56S21 E020V

P. IVA: 04330240013

DOCUMENTO

C17


35 001

OPERA

ARGOMENTO FASE DOC. PROG. / REVISIONE

TIMBRO E FIRMA

CHIAMPO



LP








0


CARTELLA: 1550/17


NOTE:

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | APPROVATO | | | | |
|--------|--|---------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 0 | EMISSIONE | 10/2017 | CHIAMPO | CHIAMPO | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| ELABOR | ELABORATO TECNICO REALIZZATO CON SOFTWARE WORD BY MICROSFT - 54566-OEM-1790657-44424 | | | | | | | |

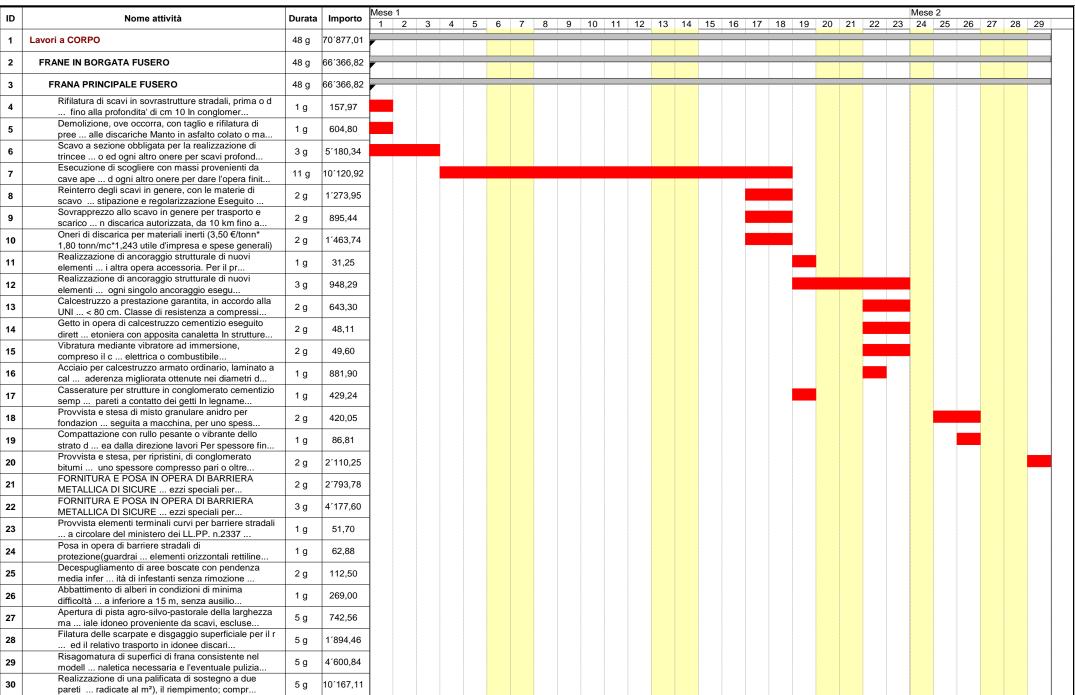


COMMITTENTE: CITTA' DI GIAVENO

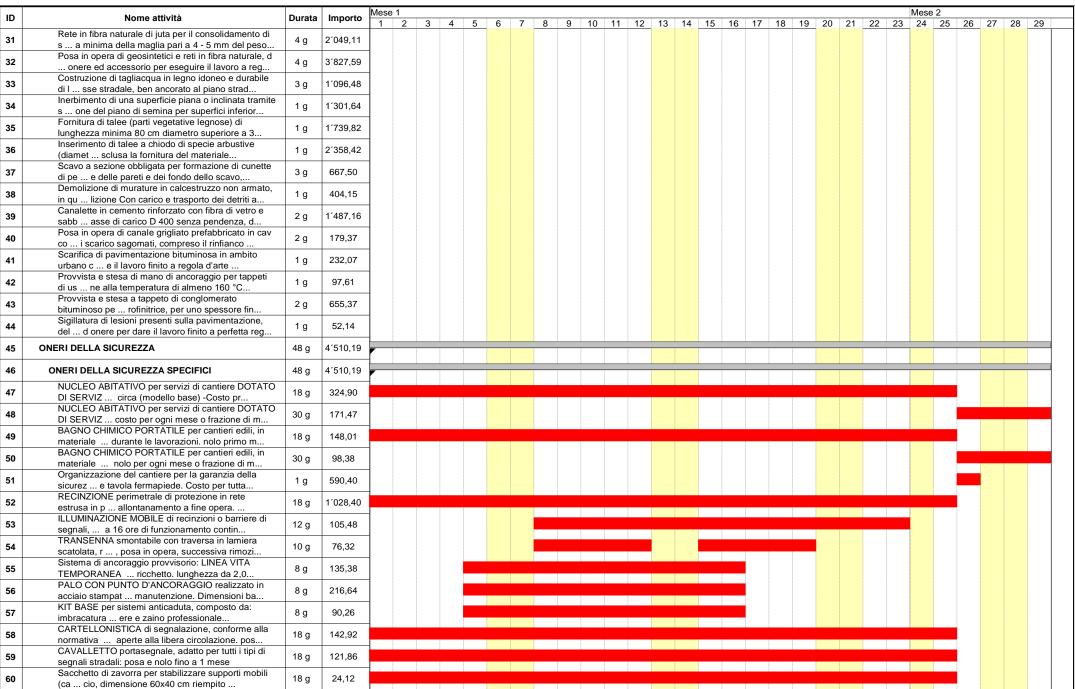

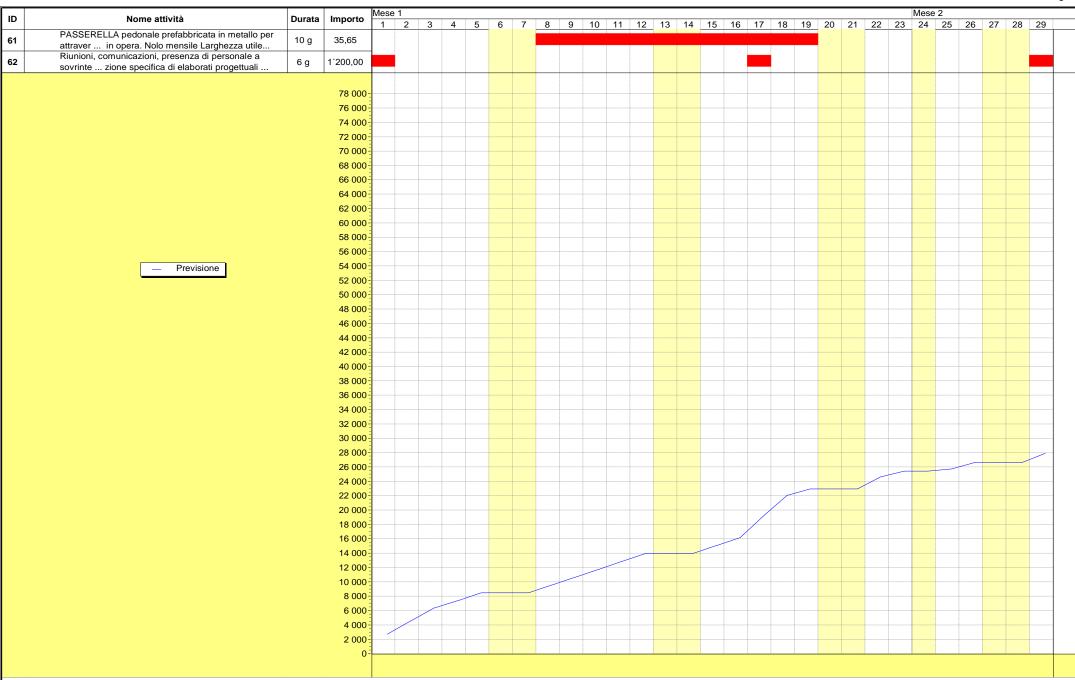

COMMITTENTE: CITTA' DI GIAVENO



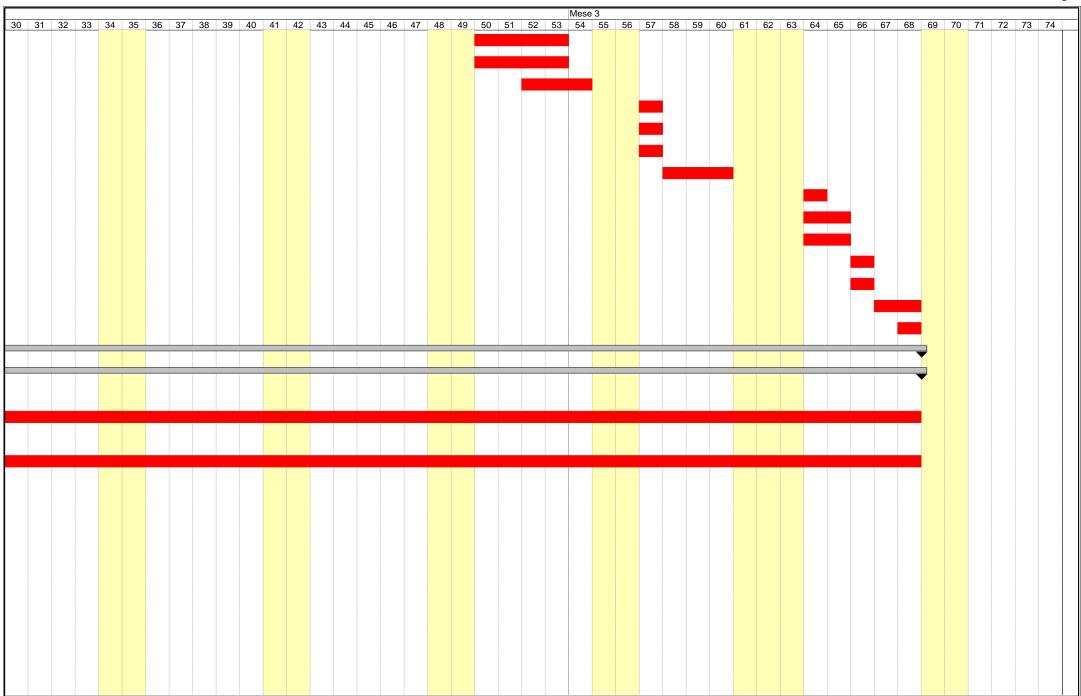



| | PREVISTO | PREVISTO | | | GIO | RNI |
|---|-----------|----------|--------|-------|------|------|
| ATTIVITA' | euro | (%) | Inizio | Fine | Lav. | Tot. |
| Lavori a CORPO | 70′877,01 | 100,000 | 1 gg | 68 gg | 48 | 68 |
| * FRANE IN BORGATA FUSERO | 66′366,82 | 93,637 | 1 gg | 68 gg | 48 | 68 |
| * * FRANA PRINCIPALE FUSERO | 66′366,82 | 93,637 | 1 gg | 68 gg | 48 | 68 |
| * * * Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o d fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso | 157,97 | 0,223 | 1 gg | 1 gg | 1 | 1 |
| * * * Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di pree alle discariche Manto in asfalto colato o malta bituminosa | 604,80 | 0,853 | 1 gg | 1 gg | 1 | 1 |
| * * * Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee o ed ogni altro onere per scavi profondità da m 2,01 a m 4 | 5′180,34 | 7,309 | 1 gg | 3 gg | 3 | 3 |
| * * * Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave ape d ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte | 10′120,92 | 14,280 | 4 gg | 18 gg | 11 | 15 |
| * * * Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo stipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico | 1′273,95 | 1,797 | 17 gg | 18 gg | 2 | 2 |
| * * * Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico n discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza | 895,44 | 1,263 | 17 gg | 18 gg | 2 | 2 |
| * * * Oneri di discarica per materiali inerti (3,50 €/tonn*1,80 tonn/mc*1,243 utile d'impresa e spese generali) | 1′463,74 | 2,065 | 17 gg | 18 gg | 2 | 2 |
| * * * Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi i altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito | 31,25 | 0,044 | 19 gg | 19 gg | 1 | 1 |
| * * * Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo | 948,29 | 1,338 | 19 gg | 23 gg | 3 | 5 |
| * * * Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 | 643,30 | 0,908 | 22 gg | 23 gg | 2 | 2 |
| * * * Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett etoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione | 48,11 | 0,068 | 22 gg | 23 gg | 2 | 2 |
| * * * Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato | 49,60 | 0,070 | 22 gg | 23 gg | 2 | 2 |
| * * * Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm | 881,90 | 1,244 | 22 gg | 22 gg | 1 | 1 |
| * * * Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma | 429,24 | 0,606 | 19 gg | 19 gg | 1 | 1 |
| * * * Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion seguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 | 420,05 | 0,593 | 25 gg | 26 gg | 2 | 2 |
| * * * Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato d ea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm | 86,81 | 0,122 | 26 gg | 26 gg | 1 | 1 |
| * * * Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bitumi uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | 2′110,25 | 2,977 | 29 gg | 30 gg | 2 | 2 |
| * * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICURE ezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. | 2′793,78 | 3,942 | 31 gg | 32 gg | 2 | 2 |

COMMITTENTE: CITTA' DI GIAVENO TABELLA DELLE ATTIVITA'

| | | | | | Г | Pag.10 |
|--|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| A | PREVISTO | | | Ŀ | GIO | RNI |
| ATTIVITA' | euro | (%) | Inizio | Fine | Lav. | Tot. |
| * * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICURE ezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. | 4′177,60 | 5,894 | 31 gg | 33 gg | 3 | 3 |
| * * * Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali a circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987 | 51,70 | 0,073 | 33 gg | 33 gg | 1 | 1 |
| * * * Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrai elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno | 62,88 | 0,089 | 33 gg | 33 gg | 1 | 1 |
| * * * Decespugliamento di aree boscate con pendenza media infer ità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta | 112,50 | 0,159 | 36 gg | 37 gg | 2 | 2 |
| * * * Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà a inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello. | 269,00 | 0,380 | 36 gg | 36 gg | 1 | 1 |
| * * * Apertura di pista agro-silvo-pastorale della larghezza ma iale idoneo proveniente da scavi, escluse le opere d'arte. | 742,56 | 1,048 | 36 gg | 40 gg | 5 | 5 |
| * * * Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il r ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate | 1′894,46 | 2,673 | 43 gg | 47 gg | 5 | 5 |
| * * * Risagomatura di superfici di frana consistente nel modell naletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali | 4′600,84 | 6,491 | 43 gg | 47 gg | 5 | 5 |
| * * * Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere | 10′167,11 | 14,345 | 43 gg | 47 gg | 5 | 5 |
| * * * Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di s a minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m² | 2′049,11 | 2,891 | 50 gg | 53 gg | 4 | 4 |
| * * * Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, d onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | 3′827,59 | 5,400 | 50 gg | 53 gg | 4 | 4 |
| * * * Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di I sse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura | 1′096,48 | 1,547 | 52 gg | 54 gg | 3 | 3 |
| * * * Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite s one del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000 | 1′301,64 | 1,836 | 57 gg | 57 gg | 1 | 1 |
| * * * Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) | 1′739,82 | 2,455 | 57 gg | 57 gg | 1 | 1 |
| * * * Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diamet sclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte | 2′358,42 | 3,327 | 57 gg | 57 gg | 1 | 1 |
| * * * Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pe e delle pareti e dei fondo dello scavo, in terreni sciolti | 667,50 | 0,942 | 58 gg | 60 gg | 3 | 3 |
| * * * Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qu lizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche | 404,15 | 0,570 | 64 gg | 64 gg | 1 | 1 |
| * * * Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabb asse di carico D 400 senza pendenza, dim. 1000 x 360 x 340 | 1′487,16 | 2,098 | 64 gg | 65 gg | 2 | 2 |
| * * * Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav co i scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: | 179,37 | 0,253 | 64 gg | 65 gg | 2 | 2 |
| * * * Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c e il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3 | 232,07 | 0,327 | 66 gg | 66 gg | 1 | 1 |
| * * * Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di us ne alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m² | 97,61 | 0,138 | 66 gg | 66 gg | 1 | 1 |

COMMITTENTE: CITTA' DI GIAVENO TABELLA DELLE ATTIVITA'

| | PREVISTO | | | | GIO | RNI |
|--|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------|------|
| ATTIVITA' | euro | (%) | Inizio | Fine | Lav. | Tot. |
| * * * Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso pe rofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | 655,37 | 0,925 | 67 gg | 68 gg | 2 | 2 |
| * * * Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, del d onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | 52,14 | 0,074 | 68 gg | 68 gg | 1 | 1 |
| * ONERI DELLA SICUREZZA | 4′510,19 | 6,363 | 1 gg | 68 gg | 48 | 68 |
| * * ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI | 4′510,19 | 6,363 | 1 gg | 68 gg | 48 | 68 |
| * * * NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZ circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese | 324,90 | 0,458 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZ costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo | 171,47 | 0,242 | 26 gg | 68 gg | 30 | 43 |
| * * * BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese | 148,01 | 0,209 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo | 98,38 | 0,139 | 26 gg | 68 gg | 30 | 43 |
| * * * Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurez e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. | 590,40 | 0,833 | 26 gg | 26 gg | 1 | 1 |
| * * * RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in p allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato | 1′028,40 | 1,451 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna | 105,48 | 0,149 | 8 gg | 23 gg | 12 | 16 |
| * * * TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, r , posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese * * * periodo 01 * * * periodo 02 | 76,32 38,16 38,16 | , | 8 gg 8 gg 15 gg | 19 gg 12 gg 19 gg | | 5 |
| * * * Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA ricchetto. lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m. | 135,38 | 0,191 | 5 gg | 16 gg | 8 | 12 |
| * * * PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampat manutenzione. Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m | 216,64 | 0,306 | 5 gg | 16 gg | 8 | 12 |
| * * * KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura ere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base | 90,26 | 0,127 | 5 gg | 16 gg | 8 | 12 |
| * * * CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese | 142,92 | 0,202 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese | 121,86 | 0,172 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca cio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg | 24,12 | 0,034 | 1 gg | 25 gg | 18 | 25 |
| * * * PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraver in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 60 | 35,65 | 0,050 | 8 gg | 19 gg | 10 | 12 |

| ***Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc | | | | | | | Pag.12 |
|--|--|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| #***Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc ****Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc ****Periodo 01 *****Periodo 03 *****periodo 04 ****periodo 05 ****periodo 06 ****periodo 07 ****periodo 06 ****periodo 07 ***periodo 06 ****periodo 07 ***periodo 07 ***periodo 07 ***periodo 08 **periodo 08 **peri | | PREVISTO | PREVISTO | | - | GIC | RNI |
| #*** periodo 01 | ATTIVITA | euro | (%) | Inizio | Fine | Lav. | Tot. |
| Tecnico | * * * periodo 0° * * * periodo 02 * * * periodo 03 * * * periodo 04 * * * periodo 05 | 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 | 0,282 0,282 0,282 0,282 | 1 gg 1 gg 17 gg 29 gg 43 gg 50 gg 64 gg | 29 gg 43 gg | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| | Data, 06/10/2017 | | | | | | |
| | Tecnico | | | | | | |
| | | | | | | | |

COMMITTENTE: CITTA' DI GIAVENO TABELLA DELLE ATTIVITA'
